

Informes Quincenales

De: Ing. Juan A. Rodas V.
(Fiscalización – Ampliación H. G. P. “Acosta Ñú”)
A: Arq. Idalia Ortiz F.
(Coordinadora de Infraestructura UEP)

Fecha: 16/ I /2019

Ref.: Actividades desarrolladas en obra. (Hospital General Pediátrico “Acosta Ñú”)

(Desde el miércoles 02/ I /2019 al martes 15/ I /2019)

Nº. 01/2019

I) Actividades diarias desarrolladas en obra

1. Miércoles 02/enero/2019

Colocación de pisos y zócalos tipo porcelanto color marfil en diferentes áreas de la Planta Alta.

Trabajos de construcción de registros pluviales (60 X 60) y colocación de tuberías livianas de 150mm., de desagüe pluvial según proyecto ejecutivo.

Tratamiento superficial de terminación, de paredes y losas antes de la pintura final; en Planta Baja y Planta Alta respectivamente.

Instalaciones eléctricas en general en Planta Alta y Planta Baja respectivamente.

2. Jueves 03/enero/2019

Visita del Señor Ministro de Salud Pública y Bienestar Social (Dr. Julio Massoleni), acompañados de su comitiva, personal de seguridad, de protocolo, como así también del Director del “Hospital Acosta Ñú” Dr. Pío Alfieri y el jefe de la cátedra de psiquiatría Dr. Casartelli.

Trabajos de colocación de azulejos en sector de sanitarios sexados de la Planta Baja.

Trabajos de construcción de registros pluviales (60 X 60) y colocación de tuberías livianas de 150mm., para desagüe pluvial según proyecto ejecutivo.

Colocación de pisos y zócalos tipo porcelanto color marfil; en diversas áreas de la Planta Alta.

Tratamiento superficial de terminación, de paredes y losas antes de la pintura final; en Planta Baja y Planta Alta respectivamente.

Instalaciones eléctricas en general en Planta Alta y Planta Baja.

Colocación de pisos y zócalos tipo porcelanto, en diferentes áreas de la Planta Alta.


Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

3. Viernes 04/enero/2019

Colocación de pisos y zócalos tipo porcelanto color marfil; en diversas áreas de la Planta Alta.

Trabajos de colocación de azulejos con franja de decorado, en sector de sanitarios sexados de la Planta Baja.

Instalaciones eléctricas en general en Planta Alta y Planta Baja respectivamente.

Instalaciones de desagüe pluvial, con los trabajos de construcción de registros pluviales (60 X 60) y colocación de tuberías livianas de 150mm., para desagüe pluvial según proyecto ejecutivo.

Trabajos de regularización de losas y paredes en Planta Alta, tratamiento superficial para buena terminación final.

Revoque exterior de terminación de las vigas correspondientes al pergolado de la fachada norte y de la Rampa exterior.

4. Sábado 05/enero/2019

Colocación de azulejos con franja de decorado, en sector de sanitarios sexados de la Planta Baja.

Instalaciones eléctricas, correspondientes a los distintos circuitos de Planta Alta y Planta Baja respectivamente.

Instalaciones de desagüe pluvial, con los trabajos de construcción de registros pluviales (60 X 60) y colocación de tuberías livianas de 150mm., para desagüe pluvial según proyecto ejecutivo.

Trabajos de regularización de losas y paredes en Planta Alta, tratamiento superficial para buena terminación final.

Revoque exterior de terminación de las losas y vigas correspondientes a la Rampa exterior.

5. Lunes 07/enero/2019.

Tratamiento superficial final de paredes y losas, antes de la pintura de terminación.

Colocación de pisos (60 X 60) y zócalos tipo porcelanto (10 X 60) color marfil; en Planta Alta.

Instalaciones eléctricas, correspondientes a los distintos circuitos de Planta Alta y Planta Baja respectivamente.

Colocación de azulejos con franja de decorado, en sector de sanitarios sexados de la Planta Baja.


Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

Instalaciones de desagüe pluvial, con los trabajos de construcción de registros pluviales (60 X 60) y colocación de tuberías livianas de 150mm., para desagüe pluvial según proyecto ejecutivo.

Instalaciones eléctricas, correspondientes a los distintos circuitos de Planta Alta y Planta Baja respectivamente.

Colocación de puertas con herrajes en los consultorios de la Planta Baja.

Trabajos de terminación de las losas y vigas correspondientes a la Rampa exterior.

✓ 6. Martes 08/enero/2019

Colocación de puertas con herrajes en los consultorios de la Planta Baja.

Instalaciones eléctricas, correspondientes a los distintos circuitos de Planta Alta y Planta Baja.

Instalaciones de desagüe pluvial, con los trabajos de construcción de registros pluviales (60 X 60) y colocación de tuberías livianas de 150mm., para desagüe pluvial según proyecto ejecutivo.

Tratamiento superficial de losas y paredes, antes de la pintura final de terminación.

Trabajos de terminación de las losas y vigas correspondientes a la Rampa exterior...

Colocación de azulejos con franja de decorado, en sector de sanitarios sexados de la Planta Baja.

7. Miércoles 09/enero/2019

La fiscalización solicita a la contratista los siguientes puntos a tener en cuenta:

- Acelerar los trámites necesarios para la puesta en servicio del transformador ya instalado.
- Instalación de los artefactos lumínicos con los interruptores correspondientes y tomacorrientes según proyecto ejecutivo.
- Colocación de ventanales y vidrios en general según proyecto ejecutivo.
- Culminar todo lo relacionado a la climatización y realizar la puesta en funcionamiento experimental a fin de realizar todos los ajustes necesarios para el 31 de enero/2019; tal como fuera solicitado por las autoridades del Hospital "Acosta Nú".

Trabajos desarrollados:

Colocación de puertas con herrajes en los consultorios de la Planta Baja.

Instalaciones eléctricas en general en Planta Alta y Planta Baja respectivamente.

Instalaciones de desagüe pluvial, con los trabajos de construcción de registros pluviales


Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

(60 X 60) y colocación de tuberías livianas de 150mm., para desagüe pluvial según proyecto ejecutivo.

Tratamiento superficial de losas y paredes, antes de la pintura final de terminación.

Trabajos de terminación de las losas y vigas correspondientes a la Rampa exterior.

Colocación de azulejos con franja de decorado, en sector de sanitarios sexados de la Planta Baja .

8. Jueves 10/enero/2019

Colocación de pisos y azulejos con franja decorativa, en sector de sanitarios de la Planta Baja y de la Planta Alta respectivamente.

Colocación de puertas con herrajes en los consultorios de la Planta Baja.

Instalaciones de desagüe pluvial, con colocación de tubos livianos de 150mm., y la construcción de registros pluviales (60 X 60), según proyecto ejecutivo.

Pinturas en general de losas y paredes, según tonalidades indicadas por las autoridades del Hospital "Acosta Nú".

Trabajos de terminación de la Rampa exterior.

Trabajos de instalaciones de desagüe cloacal, con la colocación de tubos livianos y la construcción de cámaras de inspección, según proyecto ejecutivo.

Instalaciones eléctricas en general. Montaje de Tableros Principales y seccionales, en Planta Alta y Planta Baja respectivamente.

9. Viernes 11/enero/2019.

Colocación de puertas con herrajes en los consultorios de la Planta Baja.

Instalaciones eléctricas en general. Montaje de Tableros Principales de la Planta Alta y Planta Baja respectivamente

Colocación de pisos y zócalos tipo porcelanto color marfil; en Planta Alta y Planta Baja respectivamente.

Colocación de pisos y azulejos con franjas decorativas en sector de sanitarios, de la Planta Baja y Planta Alta.

Pinturas en general de losas y paredes, según tonalidades indicadas por las autoridades del Hospital "Acosta Nú".

Instalaciones eléctricas en general, en Planta Alta y Planta Baja respectivamente.

Construcción de registros pluviales (60 X 60), y colocación de tuberías livianas de 150mm., para desagüe pluvial según proyecto ejecutivo.


Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

Trabajos de instalaciones de desagüe cloacal, con la colocación de tubos livianos y la construcción de cámaras de inspección, según proyecto ejecutivo.

10. Sábado 12/enero/2019

Trabajos de pinturas en general de losas y paredes, según tonalidades indicadas por las autoridades del Hospital.

Instalaciones eléctricas en general, correspondientes al sistema de circuitos eléctricos, de climatización y Montaje de Tableros en Planta Alta y Planta Baja respectivamente.

Construcción de registros pluviales (60 X 60), y colocación de tuberías livianas de 150mm., para desagüe pluvial según proyecto ejecutivo.

Colocación de puertas con herrajes en los consultorios de la Planta Baja.

Colocación de pisos y azulejos con franjas decorativas en sector de sanitarios, de la Planta Baja y Planta Alta.

La fiscalización solicita a la contratista:

- Iniciar lo antes posible la limpieza general de la obra; con retiro de escombros y resto de los diversos materiales diseminados por la obra, a fin de iniciar el proceso de terminación y aseo final.

11. Lunes 14/enero/2019

Ejecución de carpeta, base para piso en el acceso principal al bloque en ejecución.

Colocación de pisos y azulejos con franjas decorativas en sector de sanitarios, de la Planta Baja y Planta Alta.

Construcción de registros pluviales (60 X 60), y colocación de tuberías livianas de 150mm., para desagüe pluvial según proyecto ejecutivo.

Trabajos de pintura interior en general de losas y paredes, según tonalidades indicadas por las autoridades del Hospital.

Instalaciones eléctricas en general, correspondientes al sistema de circuitos eléctricos, de climatización y Montaje de Tableros en Planta Alta y Planta Baja respectivamente.

Colocación de puertas con herrajes en las distintas dependencias de la Planta Alta.

Colocación de mesadas de granito natural en sector de sanitarios, según color indicado por autoridades del Hospital, de uno y dos bachas, según proyecto ejecutivo.


Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

12. Martes 15/enero/2019

Construcción de registros pluviales (60 X 60), y colocación de tubos livianos de 150mm., para desagüe pluvial según proyecto ejecutivo.

Colocación de puertas con herrajes en los distintos ambientes de la Planta Alta.

Trabajos de pintura interior en genera de losas y paredes, según tonalidades indicadas por las autoridades del Hospital.


Instalaciones eléctricas en general, correspondientes al sistema de circuitos eléctricos, de climatización y Montaje de Tableros en Planta Alta y Planta Baja respectivamente.

Colocación de puertas con herrajes en los consultorios de la Planta Alta.

II) Situación General de la obra

La situación global de los trabajos componentes del contrato, se puede resumir como en etapa de finalización.

La fiscalización solicitó a la contratista en fecha 09 de enero/2019, a través del "Libro de Obra" página 0000210, acelerar algunos frentes específicos a fin de cumplir con las autoridades de Hospital; y poner en funcionamiento la parte interna del bloque en ejecución, para el 31 de enero del 2019.


.....
Ing. Juan A. Rodas V.
Fiscalización



DE EMILIO GOTZE PETERSEN

Callejón N° 10 c/ Tte. Ettiene, Zona Norte Ciudad de Fernando de la Mora
Telefax: (021) 672 - 778

LIBRO DE OBRA N° 0000204

PROPIETARIO: MSP Y BS

UBICACIÓN USF: Hospital "Acosta Nú"

RESIDENTE: Arq. Lourdes Pérez

FISCAL: Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

FECHA	TIEMPO		
DIA. 02 MES. I AÑO. 19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BUENO	NUBLADO	LLUVIA

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN. Rubros en ejecución

- 1- Trabajos de terminación de la rampa exterior.
- 2- Tratamiento superficial de losas y paredes, antes de la pintura final.
- 3- Colocación de pisos y zócalos en Planta Baja
- 4- Instalaciones eléctricas en general
- 5- Colocación de tubos livianos de 150 mm. y construcción de registros pluviales según especificaciones técnicas.

FISCAL DE OBRAS
Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

OBSERVACIÓN DE LA CONTRATISTA

- CONTINUAN LOS TRABAJOS DE:
- COLOCACION DE PISOS Y (ZÓCALOS) ZOCALOS
 - INSTALACION ELECTRICA
 - TRATAMIENTO DE LOSAS Y PAREDES PREVIO A LA PINTURA
 - CONSTRUCCION DE REGISTROS PLUVIALES

CONTRATISTA



DE EMILIO GOTZE PETERSEN

Callejón N° 10 c/ Tte. Etienne, Zona Norte Ciudad de Fernando de la Mora
Telefax: (021) 672 - 778

LIBRO DE OBRA N° 0000205

PROPIETARIO: MSP Y BS

UBICACIÓN USF: Hospital "Acosta Nú"

RESIDENTE: Arq. Lourdes Pérez

FISCAL: Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

FECHA	TIEMPO		
DIA 03 MES I AÑO 15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BUENO	NUBLADO	LLUVIA

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN. Rubros en ejecución

- 1- Colocación de pisos y zócalos en Planta Baja.
- 2- Colocación de pisos y azulejos en sector de sanitarios de la Planta Alta.
- 3- Tratamiento superficial de paredes y losas ante de la pintura de terminación.
- 4- Construcción de registros pluviales (60x60) y colocación de tuberías de 150mm de desagüe pluvial.
- 5- Instalaciones eléctricas en general.

Juan A. Rodas V.
FISCAL DE OBRAS
Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

OBSERVACIÓN DE LA CONTRATISTA

- PROSIBUEN LOS TRABAJOS DE:
- * PISOS Y ZOCALOS
 - * INSTALACIONES ELECTRICAS
 - * TRATAMIENTO DE PAREDES Y LOSAS PREVIO A LA PINTURA
 - COLOCACION DE PISOS Y AZULEJOS EN SANITARIOS
 - COLOCACION DE CANOS DE 150MM PARA DESAGUE PLUVIAL

Lourdes Pérez
CONTRATISTA



DE EMILIO GOTZE PETERSEN

Callejón N° 10 c/ Tte. Ettiene, Zona Norte Ciudad de Fernando de la Mora
Telefax: (021) 672 - 778

LIBRO DE OBRA N° 0000206

PROPIETARIO: MSP Y BS

UBICACIÓN USF: Hospital "Acosta Núñez"

RESIDENTE: Arq. Lourdes Pérez

FISCAL: Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

FECHA		TIEMPO		
DIA. 04	MES. J	AÑO. 19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			BUENO	NUBLADO
			LLUVIA	

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN... Rubros en ejecución.

- 1- Colocación de azulejos y pisos en sector de sanitarios de la Planta Alta.
- 2 Colocación de pisos y ~~azulejos~~ zócalos en Planta Baja
- 3- Instalaciones eléctricas en general (Planta Alta y Planta Baja)
4. Instalación de tubos de 150 mm. para desagüe pluvial y construcción de registros pluviales, según especificaciones técnicas.

FISCAL DE OBRAS

Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

OBSERVACIÓN DE LA CONTRATISTA.....

- COLOCACION DE PISOS Y ZOCALOS EN PLANTA BAJA Y COLOCACION DE PISOS Y AZULEJOS EN SECTOR DE SANITARIOS EN PLANTA ALTA
- INSTALACIONES:
 - * ELECTRICAS
 - * CANOS PARA DESAGUE PLUVIAL
- CONSTRUCCION DE REGISTROS PLUVIALES.

CONTRATISTA



DE EMILIO GOTZE PETERSEN

Callejón N° 10 c/ Tte. Ettiene, Zona Norte Ciudad de Fernando de la Mora
Telefax: (021) 672 - 778

LIBRO DE OBRA N° 0000207

PROPIETARIO: MSP Y BS

UBICACIÓN USF: Hospital "Acosta Nú"

RESIDENTE: Arq. Lourdes Pérez

FISCAL: Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

FECHA	TIEMPO
DIA 05 MES I AÑO 19	<input checked="" type="checkbox"/> BUENO <input type="checkbox"/> NUBLADO <input type="checkbox"/> LLUVIA

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN: Rubros en ejecución.

- 1- Colocación de pisos y azulejos en el sector de sanitarios de la Planta Alta.
- 2- Colocación de pisos y zócalos en la Planta Baja.
- 3- Instalaciones eléctricas en Planta Alta y Planta Baja.
- 4- Trabajos de instalaciones de desague pluvial con tubos de desague de 150 mm y construcción de registros pluviales según especificaciones técnicas.

FISCAL DE OBRAS
Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

OBSERVACIÓN DE LA CONTRATISTA:

- COLOCACION DE PISOS Y AZULEJOS EN SANITARIOS DE PLANTA ALTA Y DE PISOS Y ZOCALOS EN PLANTA BAJA.
- CONSTRUCCION DE REGISTROS Y DESAQUE PLUVIAL
- INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE DESAQUE PLUVIAL.

CONTRATISTA

GOTZE
Ingeniería
Arq. Lourdes Pérez
Matr. 1692

PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (PR-L1051) - PRÉSTAMO 2667 / OC - PR



DE EMILIO GOTZE PETERSEN

Callejón N° 10 c/ Tte. Ettiene, Zona Norte Ciudad de Fernando de la Mora
Telefax: (021) 672 - 778

LIBRO DE OBRA N° 0000208

PROPIETARIO: MSP Y BS

UBICACIÓN USF: *Hospital "Acosta N° 4"*

RESIDENTE: *Arq. Lourdes Pérez*

FISCAL: *Juan A. Rodas V.*
Ing. Civil

FECHA		TIEMPO		
DIA. <i>07</i>	MES. <i>J</i>	AÑO. <i>15</i>	BUENO	NUBLADO
				<input checked="" type="checkbox"/>
			LLUVIA	

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN: *Obras en ejecución.*

Sin actividad, por intensa lluvia en zona de obra

FISCAL DE OBRAS
Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

OBSERVACIÓN DE LA CONTRATISTA:

SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA

CONTRATISTA

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Fiscalización
TRIPLICADO: Contabilidad

GOTZE
Ingeniería
Arq. Lourdes Pérez
Matr. 1692



DE EMILIO GOTZE PETERSEN

Callejón N° 10 c/ Tte. Ettiene, Zona Norte Ciudad de Fernando de la Mora
Telefax: (021) 672 - 778

LIBRO DE OBRA N° 0000209

PROPIETARIO: MSP Y BS

UBICACIÓN USF: Hospital "Acosta Hú"

RESIDENTE: Arq. Lourdes Pérez

FISCAL: Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

FECHA		TIEMPO		
DIA 08	MES I	AÑO 19	BUENO	NUBLADO
				LLUVIA

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN

Rubros en ejecución:

1. Colocación de pisos en el pasillo central de la Planta Baja.
2. Instalaciones eléctricas en general en Planta Alta.
3. Pintura interior en planta Alta sector de cocina, guardería y salón unificados (Antes salón multibuso y sala de reuniones).
4. Colocación de azulejos en sector de sanitarios sexados de la Planta Baja.
5. Colocación de puertas en sector de consultorios de la Planta Baja.

Juan A. Rodas V.
FISCAL DE OBRAS
Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

OBSERVACIÓN DE LA CONTRATISTA

- COLOCACION DE AZULEJOS EN SANITARIOS DE PLANTA BAJA Y COLOCACION DE PISOS EN PLANTA BAJA (SECTOR DE AINO Y LUZ)
- PINTURA INTERIOR EN PLANTA ALTA (CIELO RASO Y PAREDES)
- COLOCACION DE PUERTOS PLACAS EN SECTOR DE CONSULTORIOS EN PLANTA BAJA
- INSTALACION ELECTRICAS EN GENERAL

Lourdes Pérez
CONTRATISTA



DE EMILIO GOTZE PETERSEN

Callejón N° 10 c/ Tte. Estiene, Zona Norte Ciudad de Fernando de la Mora
Telefax: (021) 672 - 778

LIBRO DE OBRA N° 0000210

PROPIETARIO: MSP Y BS

UBICACIÓN USF Hospital "Acosta Nú"

RESIDENTE: Arq. Lourdes Pérez

FISCAL: Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

FECHA		TIEMPO		
DIA 09	MES J	AÑO 19	<input checked="" type="checkbox"/>	
			BUENO	NUBLADO
				LLUVIA

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN

Rubros en ejecución.

La fiscalización solicita a la contratista por este medio, los siguientes puntos muy importantes:

- 1- Acelerar los trámites necesarios para la puesta en servicio del transformador ya instalado.
- 2- Instalación de los artefactos lumínicos con sus respectivos interruptores y tomacorrientes según proyecto ejecutivo.
- 3- Colocación de los ventanales y vidrios en general según proyecto.
- 4- Culminar todo lo referente a climatización y realizar una puesta en funcionamiento experimental, a fin de realizar ajustes en general antes del 31/enero/2019.

Juan A. Rodas V.
FISCAL DE OBRAS
Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

OBSERVACIÓN DE LA CONTRATISTA

- TODOS ESTOS PUNTOS SOLICITADOS SE ESTAN AGILIZANDO, DE MANERA A DAR UNA RESPUESTA SATISFACTORIA A LA FISCALIZACIÓN.
- CONTINUAN LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE PISOS, AZULEJOS, PUERTAS
- INSTALACION ELECTRICOS Y DESDGOE PLUVIAL.

Lourdes Pérez

CONTRATISTA



DE EMILIO GOTZE PETERSEN

Callejón N° 10 c/ Tte. Ettiene, Zona Norte Ciudad de Fernando de la Mora
Telefax: (021) 672 - 778

LIBRO DE OBRA N° 0000211

PROPIETARIO: MSP Y BS

UBICACIÓN USF: Hospital "Acosta Ño"

RESIDENTE: Arq. Lourdes Pérez

FISCAL: Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

FECHA		TIEMPO		
DIA 10...MES... I AÑO 19...		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		BUENO	NUBLADO	LLUVIA

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN: Rubras en ejecución

- 1- Instalaciones eléctricas en general.
- 2- Trabajos de desague pluvial. Construcción de registros pluviales (60x60) y colocación de tubos livianos de 150mm. para desague pluvial.
- 3- Colocación de pisos y zócalos en diversas áreas de planta alta y planta baja.
- 4- Colocación de azulejos en sector de sanitarios de la planta alta y planta baja.
- 5- Trabajos de pinturas en general.
- 6- Colocación de puertas y herrajes en planta Baja

Juan A. Rodas V.

FISCAL DE OBRAS
Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

OBSERVACIÓN DE LA CONTRATISTA:

- COLOCACION DE PUERTAS Y HERRAJES
- TRABAJOS DE PINTURA EN GENERAL
- PROSIGUEN LOS TRABAJOS DE:
 - * INSTALACION ELECTRICAS
 - * COLOCACION DE PISOS Y AZULEJOS EN SANITARIOS
 - * COLOCACION DE PISOS Y ZOCOS EN VARIAS AREAS

Lourdes Pérez

CONTRATISTA
GOTZE
Ingeniería
Arq. Lourdes Pérez
Matr. 1692



DE EMILIO GOTZE PETERSEN

Callejón N° 10 c/ Tte. Ettiene, Zona Norte Ciudad de Fernando de la Mora
Telefax: (021) 672 - 778

LIBRO DE OBRA N° 0000212

PROPIETARIO: MSP Y BS

UBICACIÓN USF: Hospital "Acosta Nú"

RESIDENTE: Arq. Lourdes Pérez

FISCAL: Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

FECHA	TIEMPO		
	BUENO	NUBLADO	LLUVIA
DIA 11 MES J AÑO 19		<input checked="" type="checkbox"/>	

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN... Rubros en ejecución

- 1- Colocación de puertas e herrajes en planta baja
- 2- Colocación de azulejos en sector de sanitarios.
- 3- Instalaciones eléctricas en Planta Alta y Planta Baja.
- 4- Pinturas en general de lasas y paredes
- 5- Excavación y colocación de tubos livianos para desague cloacal con sus respectivos registros.
- 6- Trabajos de terminación de pisos y umbrales.

FISCAL DE OBRAS

Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

OBSERVACIÓN DE LA CONTRATISTA.....

- PINTURAS EN GENERAL (PAREDES - CIELOSOSOS - CENERA)
- EXCAVACION Y COLOCACION DE CAJAS DE DESAQUE CLOACAL.
- COLOCACION DE PISOS Y UMBRALES.
- COLOCACION DE PUERTAS EN PLANTA BAJA.

CONTRATISTA



DE EMILIO GOTZE PETERSEN

Callejón N° 10 c/ Tte. Ettiene, Zona Norte Ciudad de Fernando de la Mora
Telefax: (021) 672 - 778

LIBRO DE OBRA N° 0000213

PROPIETARIO: MSP Y BS

UBICACIÓN USF Hospital "Acosta Hú"

RESIDENTE Arq. Lourdes Pérez

FISCAL: Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

FECHA		TIEMPO		
DIA 12	MES J	AÑO 19	<input checked="" type="checkbox"/>	
			BUENO	NUBLADO
			LLUVIA	

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN... Rubros en ejecución

1- Colocación de pisos y azulejos en sector de sanitarios.

2- Instalaciones eléctricas en general y montaje de tableros, en Planta Alta y Planta Baja respectivamente.

3- Pinturas de lasas y paredes interiores en general.

Nota: La fiscalización incluye limpieza general de la obra con retiro de escombros y restos de materiales en general.

FISCAL DE OBRAS
Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

OBSERVACIÓN DE LA CONTRATISTA.....

- PINTURAS EN GENERAL.
- INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS.
- COLOCACION DE PISOS Y AZULEJOS.

CONTRATISTA
GOTZE
Ingeniería
Arq. Lourdes Pérez
Matr. 1692



DE EMILIO GOTZE PETERSEN

Callejón N° 10 c/ Tte. Etienne, Zona Norte Ciudad de Fernando de la Mora
Telefax: (021) 672 - 778

LIBRO DE OBRA N° 0000214

PROPIETARIO: MSP Y BS

UBICACIÓN USF: Hospital "Acosta Núñez"

RESIDENTE: Arq. Lourdes Pérez

FISCAL: Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

FECHA		TIEMPO		
DIA 14 MES I AÑO 19		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		BUENO	NUBLADO	LLUVIA

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN

Rubros en ejecución

- 1- Ejecución de carpeta base para colocación de piso en el sector del acceso principal al bloque en ejecución.
- 2- Instalaciones eléctricas en general.
- 3- Colocación de puertas en planta baja.
- 4- Trabajos de pinturas en general en la zona interna de la obra.
- 5- Excavación y colocación de tubos livianos con cámara de inspección para desagüe local.

Juan A. Rodas V.

FISCAL DE OBRAS
Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

OBSERVACIÓN DE LA CONTRATISTA

- PROSIGUEN LOS TRABAJOS DE:
- * PINTURA EN GENERAL
 - * COLOCACION DE PISOS Y AZULEJOS
 - * INST. ELECTRICAS
- EXCAVACION Y COLOCACION DE CAÑOS PARA DESAGUE LOCAL

Lourdes Pérez

CONTRATISTA
GOTZE
Ingeniería
Arq. Lourdes Pérez
Matr. 1692



DE EMILIO GOTZE PETERSEN

Callejón N° 10 c/ Tte. Etiene, Zona Norte Ciudad de Fernando de la Mora
 Telefax: (021) 672 - 778

LIBRO DE OBRA N° 0000215

PROPIETARIO: MSP Y BS

UBICACIÓN USF: Hospital "Acosta Nú 4"

RESIDENTE: Arq. Lourdes Pérez

FISCAL: Juan A. Rodas V.
 Ing. Civil

FECHA		TIEMPO		
DIA: 15	MES: I	AÑO: 19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			BUENO	NUBLADO LLUVIA

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN: Rubros en ejecución

- 1- Colocación de puertas con herrajes en Planta Alta
- 2- Instalación eléctrica en general con montaje de Tableros en Planta Baja y Planta Alta
- 3- Construcción de registros pluviales con colocación de tubos de desague de 150 mm. según proyecto.
- 4- Colocación de pisos y azulejos en sector de sanitarios.
- 5- Pintura de losas y paredes interiores en general.

Juan A. Rodas V.

FISCAL DE OBRAS
Juan A. Rodas V.
 Ing. Civil

OBSERVACIÓN DE LA CONTRATISTA:

- COLOCACION DE MEDIDA DE GRANITO EN SANITARIOS DE PLANTA BAJA.
- PINTURA GENERAL (LOSAS, PAREDES)
- INSTALACION ELECTRICOS Y DE DESAGUE
- PERFILADO DE ABERTURAS DE VENTANOS

Lourdes Pérez

CONTRATISTA


1. Colocación de pisos en sector de sanitarios.




2. Colocación de azulejos en sector de sanitarios, con espacio para franja decorativa.



3. Revestimiento con azulejos en sector de sanitarios, y la franja decorativa superior.

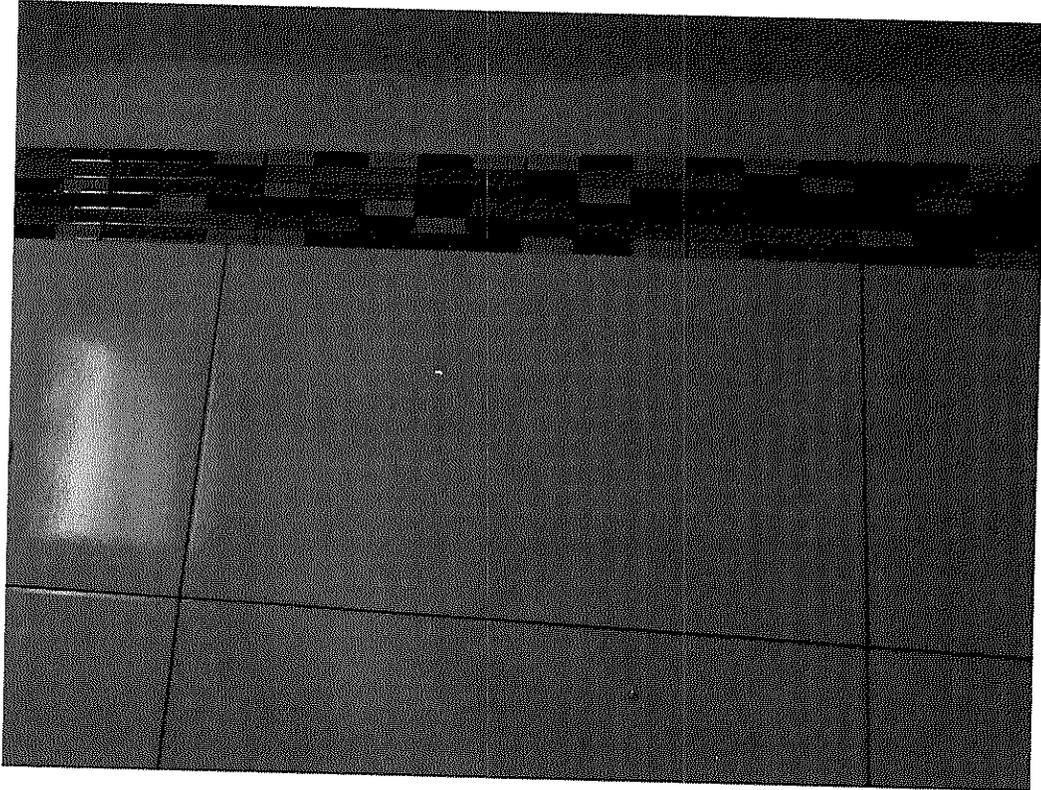

4. Pintura de terminación de paredes, en el sector del espacio central de Aire y Luz.

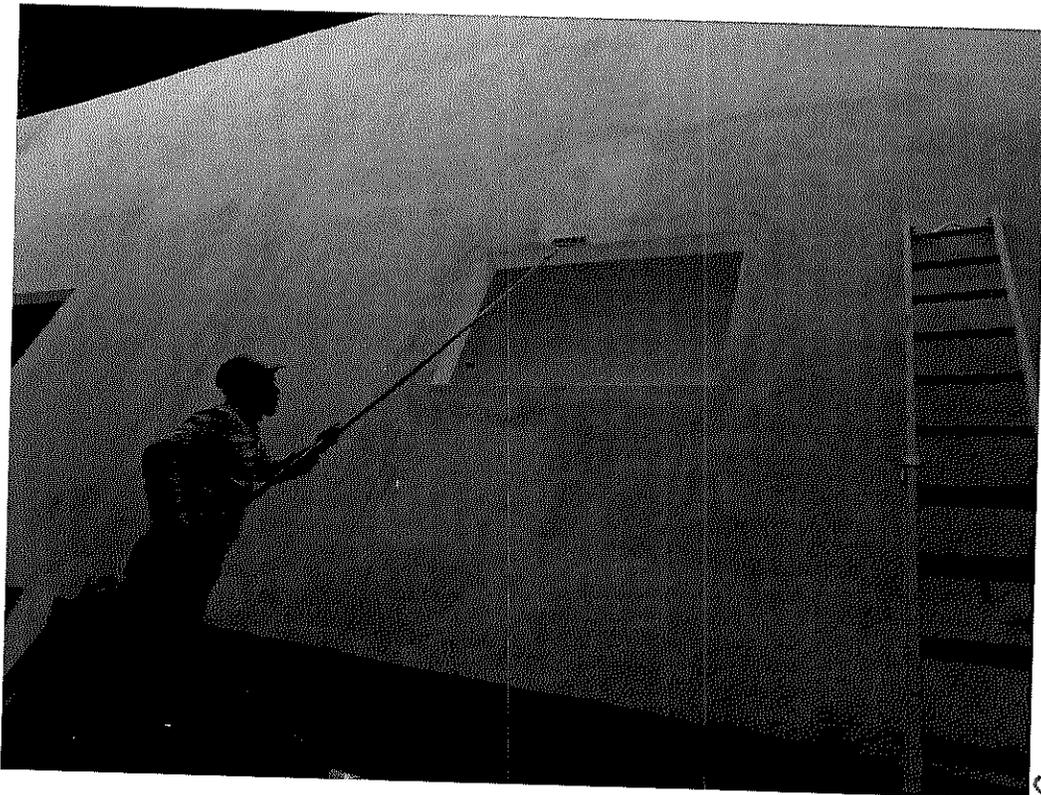


Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

5. Pintura de terminación. Paredes y de losa de la Planta Alta.



6. Colocación de puertas placas, en sector de consultorios.



7. Instalaciones eléctricas. Montaje de Tableros



8. Vista actual de la Fachada lateral derecha del edificio en ejecución.





Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

9. Colocación de puertas en Sector de consultorios (Planta Baja)



10. Revestimiento con azulejos en sector de sanitarios. Otro diseño de la franja de decorados superior.

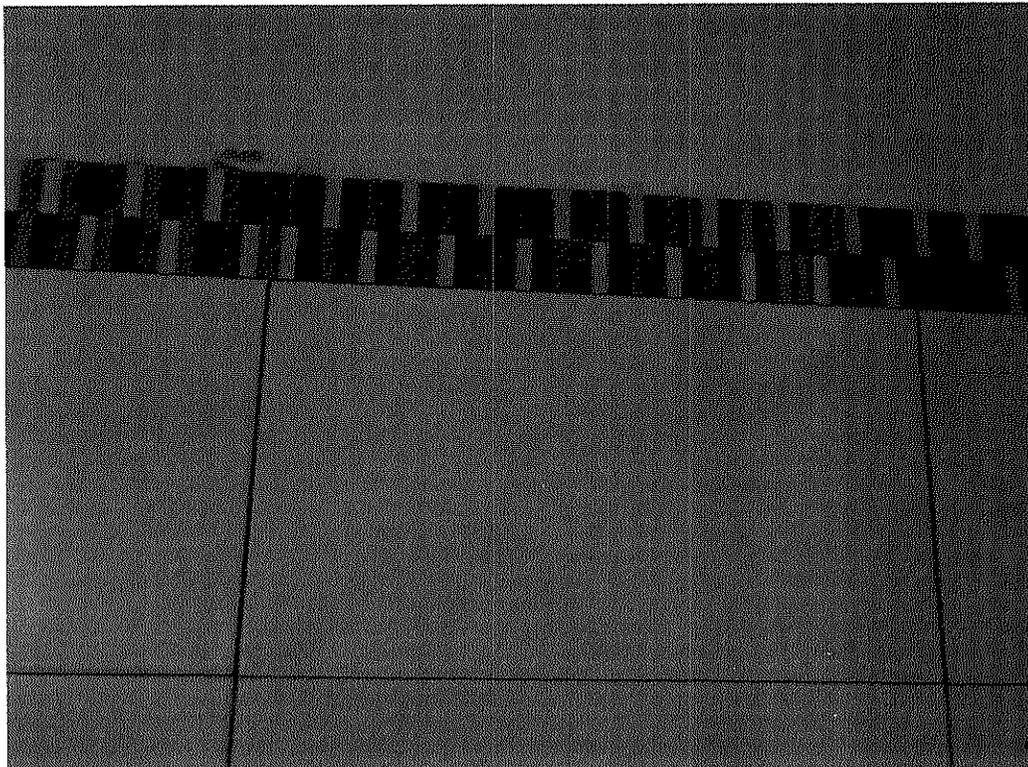


Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

11. Colocación de lavatorios con mesada de granito natural, de dos lavamanos.



12. Vista general del edificio desde el cuadrante sur-este, según su estado actual.



Ing. Juan A. Rodas V.
Consultor Individual

Email: jaristides.rodas@gmail.com.py

Teléf.: 0982-66 78 20


Asunción, 05 de febrero de 2019

Señores
Coordinación de Infraestructura UEP (MSP y BS)
Arq. Myriam Velilla
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio a dónde corresponda, a fin de presentar el **Informe Quincenal N°. 02/2019**, correspondiente a los "Servicios de Consultoría Individual" al contrato DGAF/UEP 16/2018, referente al desarrollo de los trabajos en el Hospital General Pediátrico "Acosta Ñú", de Reducto-San Lorenzo.

El referido informe contiene datos relacionados a los avances diarios, desde el día miércoles 16 de enero del 2019, hasta el día jueves 31 de enero/2019.

Sin otro particular, les saluda muy atentamente.



Ing. Juan A. Rodas V.
(Eskalización)

Informes Quincenales

De: Ing. Juan A. Rodas V.
(Fiscalización – Ampliación H. G. P. “Acosta Ñú”)

A: Arq.
(Coordinadora de Infraestructura UEP)

Fecha: 01/ II /2019

Ref.: Actividades desarrolladas en obra. (Hospital General Pediátrico “Acosta Ñú”)

(Desde el miércoles 16/ I /2019 al miércoles 31/ I /2019)

Nº. 02/2019

I) Actividades diarias desarrolladas en obra

1. Miércoles 16/enero/2019

Colocación de pisos en el Hall de acceso principal al bloque en ejecución

Construcción de registros pluviales (60 X 60), y colocación de tubos livianos de 150mm., para desagüe pluvial según proyecto ejecutivo.

Trabajos de pintura interior en genera de losas y paredes, según tonalidades indicadas por las autoridades del Hospital.

Colocación de puertas con herrajes en los distintos ambientes de la Planta Alta.

Instalaciones eléctricas en general, correspondientes al sistema de circuitos eléctricos, de climatización y Montaje de Tableros en Planta Alta y Planta Baja respectivamente.

Colocación de puertas con herrajes en los distintos ambientes de la Planta Alta.

Colocación de perfilerías de aluminio en módulos a ser cerrados con vidrios, según proyecto ejecutivo.

2. Jueves 17/enero/2019

Trabajos de metalúrgica correspondiente a la fabricación de Barandas de protección, a ser instalados en el sector del Aire y luz, según modelo indicado por autoridades del Hospital.

Colocación de pisos en el Hall de acceso principal al bloque en ejecución

Trabajos de construcción de registros pluviales (60 X 60) y colocación de tuberías livianas de 150mm., para desagüe pluvial según proyecto ejecutivo.

Trabajos de pintura interior en genera de losas y paredes, según tonalidades indicadas por las autoridades del Hospital.

Instalaciones eléctricas en general, con montaje de tableros eléctricos, en Planta Alta y Planta Baja respectivamente.

Colocación de puertas con herrajes en los distintos ambientes de la Planta Alta.

Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

3. Viernes 18/enero/2019

Instalaciones eléctricas con montaje de "Tableros Generales", en general en Planta Alta y Planta Baja respectivamente.

Instalaciones de desagüe pluvial, con los trabajos de construcción de registros pluviales (60 X 60) y colocación de tuberías livianas de 150mm., para desagüe pluvial según proyecto ejecutivo.

Trabajos de metalúrgica correspondiente a la fabricación de Barandas de protección, a ser instalados en el sector del Aire y luz, según diseño y modelo indicado por autoridades del Hospital.

Colocación de puertas con herrajes en los distintos ambientes de la Planta Alta.

Colocación de perfileras de aluminio en los vanos destinados a cerramientos vidriados, según proyecto ejecutivo.

Trabajos de pintura interior en general de losas y paredes, según tonalidades indicadas por las autoridades del Hospital.

4. Sábado 19/enero/2019

Montaje de Barandas de protección, en el sector del Aire y luz, según diseño indicado por autoridades del Hospital.

Instalaciones eléctricas con montaje de "Tableros Generales", en general en Planta Alta y Planta Baja respectivamente.

Colocación de vidrios, en los vanos destinados a cerramientos vidriados, según proyecto ejecutivo.

Trabajos de pintura interior en general de losas y paredes, según tonalidades indicadas por las autoridades del Hospital.

Instalaciones de desagüe cloacal, con los trabajos de construcción de registros cloacales y colocación de tuberías livianas de 100mm.

Colocación de puertas con herrajes en los distintos ambientes de la Planta Alta.

Se inician colocación de las planchas de Granito reconstituido, correspondiente a las huellas y contra-huellas de la escalera principal que conduce a la Planta Alta.

5. Lunes 21/enero/2019.

La fiscalización le reitera a la contratista los mismos puntos solicitados el día miércoles 09/enero/2018, y que en resumen se enumeran del siguiente modo:


Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

- ✓ - Acelerar los trámites necesarios para la puesta en servicio del transformador de 250 KVA, ya instalado.
- ✓ - Instalación de los artefactos lumínicos con los interruptores correspondientes y tomacorrientes según proyecto ejecutivo.
- ✓ - Colocación de ventanales y vidrios en general según proyecto ejecutivo.
- Culminar todo lo relacionado a la climatización y realizar la puesta en funcionamiento en forma experimental a fin de realizar todos los ajustes necesarios para el 31 de enero/2019; tal como fuera solicitado por las autoridades del Hospital "Acosta Nú".

Trabajos realizados:

- Instalaciones de desagüe cloacal, con los trabajos de construcción de registros cloacales y colocación de tuberías livianas de 100mm.
 - Colocación de puertas con herrajes en los distintos ambientes de la Planta Alta.
 - Revestimiento de escalera principal con planchas de Granito reconstituido, huellas, contra-huellas y descanso.
 - Trabajos de pintura interior en general de losas y paredes, según tonalidades indicadas por las autoridades del Hospital.
 - Instalaciones de desagüe cloacal, con los trabajos de construcción de registros cloacales y colocación de tuberías livianas de 100mm.
 - Colocación de zócalos alrededor de los pilares circulares, en el acceso principal y en el área de Aire y Luz.
 - ✓ Construcción de Guardaobras, en el sector posterior del edificio (hacia la calle).
6. Martes 22/enero/2019
- Trabajos de pintura interior en general de losas y paredes, según tonalidades indicadas por las autoridades del Hospital.
 - Colocación de puertas con herrajes en los ambientes de la Planta Alta.
 - Instalaciones eléctricas, correspondientes a los distintos circuitos de Planta Alta y Planta Baja.
 - Instalaciones de desagüe pluvial, con los trabajos de construcción de registros pluviales (60 X 60) y colocación de tuberías livianas de 150mm., para desagüe pluvial según proyecto ejecutivo.
 - Trabajos de terminación de las losas y vigas correspondientes a la Rampa exterior.
 - Instalaciones de desagüe cloacal, con colocación de tubos liviano de 100mm, y ejecución de cámaras de inspección, según indica el proyecto ejecutivo.


Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

Construcción de Guarda obras, en el sector de la fachada posterior del edificio.
Colocación de perfilerías con sus respectivos accesorios de aluminio; para ventanas del tipo batientes en los consultorios de la Planta Baja.

7. Miércoles 23/enero/2019

Construcción de Guardaobras, en el sector de la fachada posterior del edificio (hacia la calle)

Se inician trabajos de montaje de las unidades de climatización, en los distintos ambientes destinados a consultorios de la Planta Baja.

Trabajos de pintura interior en general de losas y paredes, según tonalidades indicadas por las autoridades del Hospital.

Colocación de perfilerías con sus respectivos accesorios de aluminio; para Ventanas del tipo batientes en los distintos ambientes de la Planta Alta.

Instalaciones eléctricas en general en Planta Alta y Planta Baja respectivamente, con montaje de tableros seccionales y Tableros Generales respectivamente.

Instalaciones de desagüe pluvial, con los trabajos de construcción de registros pluviales (60 X 60) y colocación de tuberías livianas de 150mm., para desagüe pluvial según proyecto ejecutivo.

Trabajos de terminación de las losas y vigas correspondientes a la Rampa exterior.

8. Jueves 24/enero/201

Trabajos de pintura interior en general de losas y paredes, según tonalidades acordadas.

Construcción de Guardaobras, en el sector de la fachada posterior del edificio.

Trabajos de montaje de las unidades de climatización, en los distintos ambientes destinados a consultorios de la Planta Baja.

Ajustes finales en la colocación de pisos y zócalos, en Planta Baja y Planta Alta respectivamente.

Instalaciones de desagüe pluvial, con colocación de tubos livianos de 150mm., y la construcción de registros pluviales (60 X 60), según proyecto ejecutivo.

Pinturas interior en general de losas y paredes, según tonalidades indicadas por las autoridades del Hospital "Acosta Ñú".

Trabajos de instalaciones de desagüe cloacal, con la colocación de tubos livianos de 100mm., y la construcción de cámaras de inspección, según proyecto ejecutivo.


Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

Instalaciones eléctricas en general. Montaje de Tableros Principales y seccionales, en Planta Alta y Planta Baja respectivamente.

9. Viernes 25/enero/2019.

Instalaciones eléctricas en general. Montaje de Tableros Principales de la Planta Alta y Planta Baja respectivamente

Colocación de pisos y zócalos tipo porcelanto color marfil; en Planta Alta y Planta Baja respectivamente.

Colocación de pisos y azulejos con franjas decorativas en sector de sanitarios, de la Planta Baja y Planta Alta.

Pinturas en genera de losas y paredes, según tonalidades indicadas por las autoridades del Hospital "Acosta Nú".

Instalaciones eléctricas en general, en Planta Alta y Planta Baja respectivamente.

Construcción de registros pluviales (60 X 60), y colocación de tuberías livianas de 150mm., para desagüe pluvial según proyecto ejecutivo.

Trabajos de instalaciones de desagüe cloacal, con la colocación de tubos livianos y la construcción de cámaras de inspección, según proyecto ejecutivo.

10. Sábado 26/enero/20198

Trabajos de pintura interior de paredes en general, según tonalidades acordadas.

Instalaciones eléctricas en general, correspondientes al sistema de circuitos eléctricos, de climatización y Montaje de Tableros en Planta Alta y Planta Baja respectivamente.

Construcción de registros pluviales (60 X 60), y colocación de tuberías livianas de 150mm., para desagüe pluvial según proyecto ejecutivo.

Colocación de puertas con herrajes en los consultorios de la Planta Baja.

Ajustes finales de pisos y zócalos, en Planta Baja y Planta Alta respectivamente.

Limpieza general de la obra; con retiro de escombros y resto de materiales .

11. Lunes 28/enero/2019

Provisión y ensamblado en obra, de los muebles destinados a la "Guardería 1P-3" (Sala de 0 a 1) de la Planta Alta.

Construcción de "Guarda obra", alrededor del edificio en ejecución.

Trabajos de pintura interior en genera de losas y paredes, según tonalidades indicadas por las autoridades del Hospital.


Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

Instalación y montaje de los lavatorios destinados a los distintos consultorios de la Planta Baja.

Instalaciones de los Equipos de 12.000 BTU de climatización, en Planta Baja correspondiente a los diferentes consultorios, según proyecto ejecutivo.

12. Martes 29/enero/2019

Se inicia la colocación del revestimiento de PVC, en sector de circulación de la Planta Baja, con un corte de 1,20m sobre el zócalo

Instalación y montaje de los lavatorios destinados a los distintos consultorios de la Planta Baja.

Instalaciones de los Equipos de climatización de 12.000 BTU en los diferentes consultorios de la Planta Baja, según proyecto ejecutivo.

Prosigue el ensamblado en obra, de los muebles destinados a la "Guardería 1P-3" (Sala de 0 a 1) de la Planta Alta.

Se inicia la colocación de mosaicos del tipo canto rodado en el sector de "Guarda obra", alrededor del edificio en ejecución.

Trabajos de pintura interior en general de paredes, según tonalidades indicadas por las autoridades del Hospital.

13. Miércoles 30/enero/2019

Revestimiento de PVC, en sector de circulación de la Planta Baja, con un corte de 1,20m sobre el zócalo.

Colocación de mosaicos del tipo canto rodado en el sector de "Guarda obra", alrededor del edificio en ejecución.

Instalación y montaje de los lavatorios destinados a los distintos consultorios de la Planta Baja.

Instalaciones de los Equipos de climatización de 12.000 BTU en los diferentes consultorios de la Planta Baja, según proyecto ejecutivo.

Trabajos de pintura interior en general de paredes y puertas, según tonalidades acordadas con las autoridades del Hospital.

Limpieza de obra, con retiro de escombros.

14. Jueves 31/enero/2019

Colocación de mosaicos del tipo canto rodado en el sector de "Guarda obra", alrededor del edificio en ejecución.


Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

Revestimiento de PVC, en sector de circulación de la Planta Baja, con un corte de 1,20m sobre el zócalo ($H_{total}= 1,30m.$)

Instalación y puesta en funcionamiento de los diferentes artefactos sanitarios, en los ambientes especialmente diseñados para la Planta Alta (Guarderías para diferentes edades y artefactos sanitarios para los mismos), según proyecto ejecutivo.

Montaje e Instalaciones de los Equipos de climatización, en los diferentes ambientes de la Planta Alta, según proyecto ejecutivo.


Trabajos de pintura interior en general de paredes y puertas, según tonalidades acordadas con las autoridades del Hospital.

Colocación de franja decorativa en los sanitarios de la Planta Baja, según diseño acordado con las autoridades del Hospital.

✓ **II) Situación General de la obra**

La situación global de la obra y los trabajos componentes del contrato DGAF N°.23/2017, se puede resumir como en su etapa de finalización. La fiscalización solicitó a la contratista en fecha 09 de enero/2019, a través del "Libro de Obra" en su página N°. 0000210 y reitera el mismo pedido de acelerar el desarrollo de las obras, a través del mismo "Libro de Obra" en su página N°. 0000220 de fecha 21/enero/2019 en algunos frentes específicos a fin de cumplir con las autoridades de Hospital; y poner en funcionamiento la parte interna del bloque en ejecución, para el 31 de enero del 2019.

Si bien no se llegó a cumplir con el objetivo solicitado por las autoridades del Hospital, la parte interna del "Bloque en ejecución", se encuentra en su etapa de culminación.


Ing. Juan A. Rodas V.
Fiscalización

PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (PR-L1051) - PRÉSTAMO 2667 / OC - PR



DE EMILIO GOTZE PETERSEN

Callejón N° 10 c/ Tte. Ettiene, Zona Norte Ciudad de Fernando de la Mora
Telefax: (021) 672 - 778

LIBRO DE OBRA N° 0000216

PROPIETARIO: MSP Y BS

UBICACIÓN USF: Hospital "Acosta Nuñez"

RESIDENTE: Arq. Lourdes Pérez

FISCAL: Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

FECHA		TIEMPO		
DIA. 16 MES. I AÑO. 19		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		BUENO	NUBLADO	LLUVIA

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN *Rubros en ejecución -*

- 1- Colocación de puertas con herrajes en Planta Alta.
- 2- Pintura interior de paredes según tonalidades definida por autoridades del Hospital.
- 3- Montaje de estructuras de aluminio para sistema de las aberturas de vidrio según proyecto ejecutivo.
- 4- Construcción del sistema de desague pluvial, con registros pluviales (60x60) y tubos livianos de 150mm.
- 5- Colocación de mesadas en granito natural de una y dos lavamanos en sector de sanitarios.

Juan A. Rodas V.

FISCAL DE OBRAS
Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

OBSERVACIÓN DE LA CONTRATISTA

- PERFILEADO DE ALUMINIO (COLOCACION) PARA ABERTURAS DE VIDRIOS TEMPLODOS Y VIDRIOS FLOS.
- COLOCACION DE ABERTURAS DE MADERA EN P. ALTA
- PINTURA LATEX DE PAREDES INTERIORES
- COLOCACION DE MESADA DE GRANITO EN SANITARIOS
- CONSTRUCCION DE REGISTROS PLUVIALES Y COLOCACION DE CAÑERIAS DE 150MM.

Lourdes Pérez

CONTRATISTA



Arq. Lourdes Pérez
Matr. 1692

PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (PR-L1051) - PRÉSTAMO 2667 / OC - PR



DE EMILIO GOTZE PETERSEN

Callejón N° 10 c/ Tte. Ettiene, Zona Norte Ciudad de Fernando de la Mora
Telefax: (021) 672 - 778

LIBRO DE OBRA N° 0000217

PROPIETARIO: MSP Y BS

UBICACIÓN USF: Hospital "Acosta Nú"

RESIDENTE: Arq. Lourdes Pérez

FISCAL: Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

FECHA		TIEMPO			
DIA 17	MES I	AÑO 19	BUENO	NUBLADO	LLUVIA

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN *Rubros en ejecución*

- 1- Colocación de pisos en el Hall de acceso principal.
- 2- Instalaciones eléctricas en general y montaje de tableros principales en planta baja y planta alta.
- 3- Trabajos de colocación de puertas en planta alta, con sus herrajes correspondientes.
- 4- Pintura de lasas y paredes interiores en general, según tonalidades definidas por las autoridades del hospital.
- 5- Trabajos de colocación de muebles en guarderías y farmacia.
- 6- Fabricación de Baranda metálica destinado a proteger el espacio central de aire y Luz del segundo piso.

FISCAL DE OBRAS

Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

OBSERVACIÓN DE LA CONTRATISTA

- CONTINUAN LOS TRABAJOS DE PINTURA LATEX, EN LAS PAREDES INTERIORES
- COLOCACION DE PISO PORCELANADO EN ACCESO PRINCIPAL
- COLOCACION DE ABERTURAS DE MADERA (PUERTAS) EN PLANTA ALTA CON LAS CERRADURAS CORRESPONDIENTE
- COLOCACION DE MUEBLES EN SALA DE GUARDERIA Y FARMACIA
- FABRICACION DE BARANDA DE MALLA EXPANDIDA PARA AIRE Y LUZ

Lourdes Pérez

CONTRATISTA

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Fiscalización
TRIPLICADO: Contabilidad

GOTZE
Ingeniería
Arq. Lourdes Pérez
Matr. 1692



DE EMILIO GOTZE PETERSEN

Callejón N° 10 c/ Tte. Etiéne, Zona Norte Ciudad de Fernando de la Mora
Telefax: (021) 672 - 778

LIBRO DE OBRA N° 0000218

PROPIETARIO: MSP Y BS

UBICACIÓN USF Hospital "Acosta Nu

RESIDENTE: Arq. Lourdes Pérez

FISCAL: Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

FECHA		TIEMPO		
DIA 18	MES I	AÑO 19	<input checked="" type="checkbox"/>	
			BUENO	NUBLADO LLUVIA

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN Rubros en ejecución

- 1.- fabricación de barandas metálicas con malla expandida a ser instalado en el Nivel 2 del sector de Aire y Luz.
- 2.- Pinturas en general en Planta Alta y Planta Baja, con las tonalidades según indicaciones aprobadas.
- 3.- Colocación de puertas con herrajes en Planta Alta.
- 4.- Trabajos de guarda obra correspondiente al rubro de "Acuerdos complementarios"
- 5.- Se inician colocación de vidrios dentro de las estructuras de aluminio ya colocados.

Juan A. Rodas V.
FISCAL DE OBRAS
Ing. Civil

OBSERVACIÓN DE LA CONTRATISTA

- CONTINUAN LOS TRABAJOS DE:
- + PINTURAS GENERALES EN PLANTA BAJA Y ALTA.
- + COLOCACION DE ABERTURAS DE MADERA
- + FABRICACION DE BARANDAS METALICAS CON MALLA EXPANDIDA
- COLOCACION DE VIDRIOS TEMPLADOS (ABERTURAS Y FIOS) CON PERFILES DE ALUMINIO
- CONSTRUCCION DE GUARDAOBRAS

Lourdes Pérez
CONTRATISTA

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Fiscalización
TRIPLICADO: Contabilidad

GOTZE Ingeniería
Arq. Lourdes Pérez
Matr. 1692

PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (PR-L1051) - PRÉSTAMO 2667 / OC - PR



DE EMILIO GOTZE PETERSEN

Callejón N° 10 c/ Tte. Etienne, Zona Norte Ciudad de Fernando de la Mora
Telefax: (021) 672 - 778

LIBRO DE OBRA N° 0000220

PROPIETARIO: MSP Y BS

UBICACIÓN USF: Hospital "Acosta Nú"

RESIDENTE: Arq. Lourdes Pérez

FISCAL: Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

FECHA		TIEMPO			
DIA	MES	AÑO	BUENO	NUBLADO	LLUVIA
21	I	19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN: *Pubras en ejecución.*

La fiscalización reitera a la contratista lo solicitado en fecha 031.II.19, página N° 000210 del presente "Libro de Obra", al fin de cumplir con el pedido de las autoridades del hospital, de modo a lograr el funcionamiento interno del nuevo bloque en ejecución.

FISCAL DE OBRAS
Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

OBSERVACIÓN DE LA CONTRATISTA:

SE ESTA REALIZANDO LAS GESTIONES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TRANSFORMADOR, COMO ASI DE LOS OTROS PEDIDOS REALIZADOS POR LA FISCALIZACION.

- CONTINUAN LOS TRABAJOS DE
- + PINTURA INTERIOR
- + COLOCACION DE ABERTURAS

- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESQUE CLASICAL Y PLUVIA CON SUS CORRESPONDIENTES REGISTROS.

CONTRATISTA

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Fiscalización
TRIPPLICADO: Contabilidad



PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (PR-L1051) - PRÉSTAMO 2667 / OC - PR



DE EMILIO GOTZE PETERSEN

Callejón N° 10 c/ Tte. Etienne, Zona Norte Ciudad de Fernando de la Mora
Teléfono: (021) 672 - 778

LIBRO DE OBRA N° 0000219

PROPIETARIO: MSP Y BS

UBICACIÓN USF: Hospital "Acosta Núñez"

RESIDENTE: Arq. Lourdes Pérez

FISCAL: Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

FECHA	TIEMPO
DIA 19 MES I AÑO 19	<input checked="" type="checkbox"/> BUENO <input type="checkbox"/> NUBLADO <input type="checkbox"/> LLUVIA

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN: Obras en ejecución.

1. Montaje de las Barandas metálicas fabricadas en chapa expandida, Sector de Aire y Luz de la Planta Alta
2. Colocación de puertas con herrajes en Planta Alta
3. Colocación de vidrios en las puertas principales de acceso con estructuras y accesorios en perfilera de aluminio.
4. Terminación de pisos y bordes similar a los utilizados en los umbrales.

FISCAL DE OBRAS

Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

OBSERVACIÓN DE LA CONTRATISTA:

- COLOCACION DE VIDRIOS TEMPLOS EN (PUERTAS Y FIJOS) CON PERFILERIA DE ALUMINIO
- COLOCACION DE BORDADA CON MDLUA EXPANDIDA EN AIRE Y LUZ
- PISOS PORCELANADOS EN ACCESO PRINCIPAL
- COLOCACION DE PUERTA EN PLANTA ALTA

CONTRATISTA

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Fiscalización
TRIPLICADO: Contabilidad

PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (PR-L1051) - PRÉSTAMO 2667 / OC - PR



DE EMILIO GOTZE PETERSEN

Callejón N° 10 c/ Tte. Etienne, Zona Norte Ciudad de Fernando de la Mora
Telefax: (021) 672 - 778

LIBRO DE OBRA N° 0000221

PROPIETARIO: MSP Y BS

UBICACIÓN USF Hospital "Acosta Ñu"

RESIDENTE: Arq. Lourdes Pérez

FISCAL: Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

FECHA	TIEMPO
DIA 22 MES I AÑO 19	<input checked="" type="checkbox"/> BUENO <input type="checkbox"/> NUBLADO <input type="checkbox"/> LLUVIA

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN Rubros en ejecución

- 1- Construcción de "Guardaobra", en el sector de la fachada Norte.
- 2- Construcción del sistema de desagüe cloacal, con tubos livianos de 100 mm, con sus cámaras de inspección, según proyecto ejecutivo.
- 3- Construcción del sistema de desagüe pluvial con tubos livianos de 150 mm con sus registros correspondientes.
- 4- Colocación de perfileras de aluminio con sus accesorios para las ventanas proyectantes de los consultorios de la Planta Baja.

FISCAL DE OBRAS
Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

OBSERVACIÓN DE LA CONTRATISTA

- COLOCACION DE VENTANAS PROYECTANTES CON PERFILERIA DE ALUMINIO EN PUNTA BAJA
- DESDQUE CLOACAL CON CAMARA DE INSPECCION Y COLOCACION DE CDOS DE 100 MM. Y DESDQUE PLUVIAL CON REGISTROS DE 60x60 CON COLOCACION DE CDOS DE 150 MM.
- CONSTRUCCION DE GUARDOBRAS

CONTRATISTA

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Fiscalización
TRIPLICADO: Contabilidad

Arq. Lourdes Pérez
Matr. 1692

PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (PR-L1051) - PRÉSTAMO 2667 / OC - PR



DE EMILIO GOTZE PETERSEN

Callejón N° 10 c/ Tte. Etienne, Zona Norte Ciudad de Fernando de la Mora
Telefax: (021) 672 - 778

LIBRO DE OBRA N° 0000222

PROPIETARIO: MSP Y BS

UBICACIÓN USF Hospital "Acosta Nuñez"

RESIDENTE: Arq. Lourdes Pérez

FISCAL: Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

FECHA		TIEMPO			
DIA	MES	AÑO	BUENO	NUBLADO	LLUVIA
23	I	19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN. Rubros en ejecución.

1. Construcción de "Guardaobra" en el sector de la fachada Norte.
2. Colocación de perfileras de aluminio con sus accesorios, en las ventanas de la planta alta.
3. Se inician la instalación de las unidades de climatización en la Planta Baja.
4. Trabajos de pintura interior según tonalidades indicadas.
5. Montaje en obra del mueble fabricado para enfermería según proyecto ejecutivo.

Juan A. Rodas V.
FISCAL DE OBRAS
Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

OBSERVACIÓN DE LA CONTRATISTA.

- CONTINUAR LOS TRABAJOS DE:
 - + COLOCACION DE VENTANAS PROYECTANTES EN PLANTA ALTA
 - + PINTURA INTERIOR DE PAREDES
 - + CONSTRUCCION DE GUARDA OBRAS.
- COLOCACION EN PLANTA BAJA DE LAS UNIDADES DE CLIMATIZACION.

Lourdes Pérez
CONTRATISTA

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: FISCALIZACIÓN
TRIPLICADO: CONTABILIDAD



PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (PR-L1051) - PRÉSTAMO 2667 / OC - PR



DE EMILIO GOTZE PETERSEN

Callejón N° 10 c/ Tte. Ettiene, Zona Norte Ciudad de Fernando de la Mora
Telefax: (021) 672 - 778

LIBRO DE OBRA N° 0000223

PROPIETARIO: MSP Y BS

UBICACIÓN USF: Hospital Acosta Nú.

RESIDENTE: Arq. Lourdes Pérez

FISCAL: Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

FECHA		TIEMPO		
24	MES. I	AÑO. 19	<input checked="" type="checkbox"/>	
			BUENO	NUBLADO
			LLUVIA	

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN: Rubras en ejecución.

1. Pintura interior en general según tonalidades indicadas para cada ambiente.
2. Instalaciones eléctricas en general, con montaje de tableros en Planta Baja y P. Alta.
3. Construcción de "Guarda obra", según acuerdos modificatorios.
4. Ajustes finales en la colocación de pisos y zócalos en general.
5. Instalaciones cloacales con colocación de tubos PVC livianos de 100 m.m. y cámaras de inspección, según proyecto ejecutivo.

FISCAL DE OBRAS
Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

OBSERVACIÓN DE LA CONTRATISTA:

- CONTINUAR TRABAJOS DE:
 - + PINTURA INTERIOR
 - + CONSTRUCCION DE GUARDA OBRAS
 - + INSTALACION CLOACAL Y PLUVIAL
 - + MONTAJE DE TABLENOS EN P.BAJA Y P.ALTA
- COLOCACION DE PUNCHAS DE GRANITO RECONSTITUIDO EN ESCALERA

Lourdes Pérez
CONTRATISTA

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Fiscalización
TRIPLICADO: Contabilidad



PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (PR-L1051) - PRÉSTAMO 2667 / OC - PR



DE EMILIO GOTZE PETERSEN

Callejón N° 10 c/ Tte. Ettiene, Zona Norte Ciudad de Fernando de la Mora
Telefax: (021) 672 - 778

LIBRO DE OBRA N° 0000224

PROPIETARIO: MSP Y BS

UBICACIÓN USF Hospital "Acosta Nú"

RESIDENTE: Arq. Lourdes Pérez

FISCAL: Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

FECHA		TIEMPO		
DIA 25 MES I AÑO 19		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		BUENO	NUBLADO	LLUVIA

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN Rubros en ejecución

- 1- Pintura interior de paredes en general, tanto en Planta Baja como en Planta Alta, según tonalidades acordados.
- 2- Ajustes finales de pisos y zócalos en Planta Baja como en Planta Alta.
- 3- Instalaciones eléctricas en general con montaje de tableros, en Planta Baja como en Planta Alta.
- 4- Colocación de tapas de HOA, a los registros cloacales.
- 5- Se inician limpieza de obra.

Juan A. Rodas V.
FISCAL DE OBRAS
Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

OBSERVACIÓN DE LA CONTRATISTA

- PROSIGUEN LOS TRABAJOS DE:
 - + PINTURA INTERIOR
 - + COLOCACION DE PLANCHA DE GRANITO EN ESCUELA
 - + INSTALACIONES ELECTRICAS, CLOACALES Y PLUVIALES
- COLOCACION DE TAPAS DE HOA EN REGISTROS CLOACALES
- TRABAJOS DE LIMPIEZA

Lourdes Pérez
CONTRATISTA
GOTZE
Ingeniería
Arq. Lourdes Pérez
Matr. 1692

PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (PR-L1051) - PRÉSTAMO 2667 / OC - PR



DE EMILIO GOTZE PETERSEN

Callejón N° 10 c/ Tte. Etienne, Zona Norte Ciudad de Fernando de la Mora
Telefax: (021) 672 - 778

LIBRO DE OBRA N° 0000225

PROPIETARIO: MSP Y BS

UBICACIÓN USF: Hospital "Acosta Nú"

RESIDENTE: Arq. Lourdes Pérez

FISCAL: Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

FECHA	TIEMPO
DIA 26...MES... I AÑO... 19...	<input checked="" type="checkbox"/> BUENO <input type="checkbox"/> NUBLADO <input type="checkbox"/> LLUVIA

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN *Rubros en ejecución*

- 1- Pintura interior de paredes en general según tonalidades aprobadas para cada ambiente.
- 2- Ajustes de pisos y zócalos en Planta Baja y Planta Alta.
- 3- Construcción de "Guarda obras" alrededor del edificio en construcción.
- 4- Limpieza de obra con retiro de escombros.

FISCAL DE OBRAS
Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

OBSERVACIÓN DE LA CONTRATISTA

- TRABAJOS DE PINTURA INTERIOR
- CONSTRUCCION DE ESCOMBROS
- RETIRO DE ESCOMBROS
- COLOCACION DE PLANCHAS DE GRANITO EN ESCALERA

CONTRATISTA

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Fiscalización
TRIPLICADO: Contabilidad

GOTZE
Ingeniería
Arq. Lourdes Pérez
Matr. 1692

PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (PR-L1051) - PRÉSTAMO 2667 / OC - PR



DE EMILIO GOTZE PETERSEN

Callejón N° 10 c/ Tte. Etienne, Zona Norte Ciudad de Fernando de la Mora
Telefax: (021) 672 - 778

LIBRO DE OBRA N° 0000226

PROPIETARIO: MSP Y BS

UBICACIÓN USF: Hospital "Acosta Núñez"

RESIDENTE: Arq. Lourdes Pérez

FISCAL: Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

FECHA	TIEMPO		
DIA 28 MES. I AÑO 19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BUENO	NUBLADO	LLUVIA

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN *Obras en ejecución*

- 1- Provisión y montaje en obra de los muebles destinados a la "Guardería IP-3" (Planta Alta)
- 2- Pintura interior en general según tonalidades aprobadas para cada ambiente.
- 3- Instalación y montaje de los lavatorios con pedestal, destinados a los consultorios de la Planta Baja.
- 4- Continúan limpieza de obra con retiro de escombros.

Juan A. Rodas V.
FISCAL DE OBRAS
Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

OBSERVACIÓN DE LA CONTRATISTA

- COLOCACION DE MUEBLES EN MUEBMINO EN PUNTA ALTA
- CONTINUAN LOS TRABAJOS DE PINTURA INTERIOR.
- INSTALACION DE MUEBMINOS CON PEDESTAL EN CONSULTORIOS PLANTA BAJA, PREVIO AZUELAO DE PARED.

Lourdes Pérez
CONTRATISTA

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Fiscalización
TRIPLICADO: Contabilidad



PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (PR-L1051) - PRÉSTAMO 2667 / OC - PR



DE EMILIO GOTZE PETERSEN

Callejón N° 10 c/ Tte. Etienne, Zona Norte Ciudad de Fernando de la Mora
Telefax: (021) 672 - 778

LIBRO DE OBRA N° 0000227

PROPIETARIO: MSP Y BS

UBICACIÓN USF: Hospital "Acosta Núñez"

RESIDENTE: Arq. Lourdes Pérez

FISCAL: Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

FECHA		TIEMPO		
DIA 29	MES I	AÑO 19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			BUENO	NUBLADO
				LLUVIA

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN *Dubras en ejecución.*

- 1- Colocación de mosaicos tipo canto rodado en el sector de "Guarda obras"
- 2- Colocación e instalación de lavatorios con pedestal en los distintos consultorios de la Planta Baja.
- 3- Pintura interior de paredes en los diversos consultorios con los tonalidades indicadas para cada caso.
- 4- Se inicia la colocación del revestimiento de PVC en el sector de circulación de la Planta Baja (h=1,20 m., sobre el zócalo).

Juan A. Rodas V.
FISCAL DE OBRAS
Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

OBSERVACIÓN DE LA CONTRATISTA

- CONTINUAN LOS TRABAJOS DE:
- + PINTURA INTERIOR
 - + COLOCACION E INSTALACION DE LAVATORIOS CON PEDESTAL EN CONSULTORIOS DE PLANTA BAJA, PREVIA PUNTEADO DE PAREDES
 - COLOCACION DE REVESTIDO EN PVC POR LAS PAREDES EN SECTOR CIRCULACION A UNA ALTURA 1,20 + ZOCALO A PEDIDO DE LA ARQ VALUELOS DEL PEDIATRICO.
 - COLOCACION DE PISO CANTO RODADO EN EL SECTOR GUARDA OBRAS

Lourdes Pérez
CONTRATISTA

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Fiscalización
TRIPLICADO: Contabilidad

PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (PR-L1051) - PRÉSTAMO 2667 / OC - PR



DE EMILIO GOTZE PETERSEN

Callejón N° 10 c/ Tte. Etienne, Zona Norte Ciudad de Fernando de la Mora
Telefax: (021) 672 - 778

LIBRO DE OBRA N° 0000228

PROPIETARIO: MSP Y BS

UBICACIÓN USF Hospital "Acosta Hú"

RESIDENTE: Arq. Lourdes Pérez

FISCAL: Juan A. Rodas V.

Ing. Civil

FECHA		TIEMPO		
DIA. 30	MES. I	AÑO. 19	<input checked="" type="checkbox"/>	
			BUENO	NUBLADO
			LLUVIA	

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN. Obras en ejecución.

1. Colocación del revestimiento de PVC en Planta Baja, sector de circulación.
2. Colocación de pisos del tipo canto rodado en el sector de "Guardabarras".
3. Montaje e instalación de lavatorios con pedestal en los diversos consultorios de la Planta Baja.
4. Pintura interior de terminación en los diversos consultorios con las tonalidades indicadas (Planta Baja).

FISCAL DE OBRAS
Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

OBSERVACIÓN DE LA CONTRATISTA

- PROSIGUEN LOS TRABAJOS DE:
- + PINTURA INTERIOR
 - + COLOCACION DE REVESTIMIENTO DE PVC
 - + COLOCACION DE PISO CANTO RODADO EN GUARDAOBRA
 - + INSTALACION DE LAVAMANOS EN CONSULTORIOS, PREVIO AZULEADO EN LA PARED.

CONTRATISTA

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Fiscalización
TRIPPLICADO: Contabilidad

GOTZE
Ingeniería
Arq. Lourdes Pérez
Matr. 1692

PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (PR-L1051) - PRÉSTAMO 2667 / OC - PR



DE EMILIO GOTZE PETERSEN

Callejón N° 10 c/ Tte. Etienne, Zona Norte Ciudad de Fernando de la Mora
Telefax: (021) 672 - 778

LIBRO DE OBRA N° 0000229

PROPIETARIO: MSP Y BS

UBICACIÓN USF: Hospital "Acosta Núñez"

RESIDENTE: Arq. Lourdes Pérez

FISCAL:

FECHA		TIEMPO		
DIA. 31	MES. I	AÑO. 19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			BUENO	NUBLADO
			LLUVIA	

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN. Rubros en ejecución.

1. Revestimiento de PVC según modelo y color aprobado en el sector de circulación de la Planta Baja.
2. Montaje, conexión y puesta en funcionamiento de los artefactos sanitarios en Planta Alta.
3. Montaje e instalación de los equipos de climatización en Planta Alta.
4. Conexiones eléctricas para comando de luces y tomacorrientes, según proyecto.
5. Colocación de mosaicos tipo canto rodado en "Guarda obra" (según acuerdo modificatorio)

FISCAL DE OBRAS
Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

OBSERVACIÓN DE LA CONTRATISTA


- + REVESTIMIENTO DE PVC EN SECTOR DE CIRCULACION EN PLANTA BAJA
- + MONTAJE E INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION
- + COLOCACION DE PISO CANTO RODADO EN GUARDABARRA

Lourdes Pérez
CONTRATISTA


ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Fiscalización
TRIPLICADO: Contabilidad

GOTZE
Ingeniería
Arq. Lourdes Pérez
Matr. 1692

1. Base azulejado para muebles de cocina.

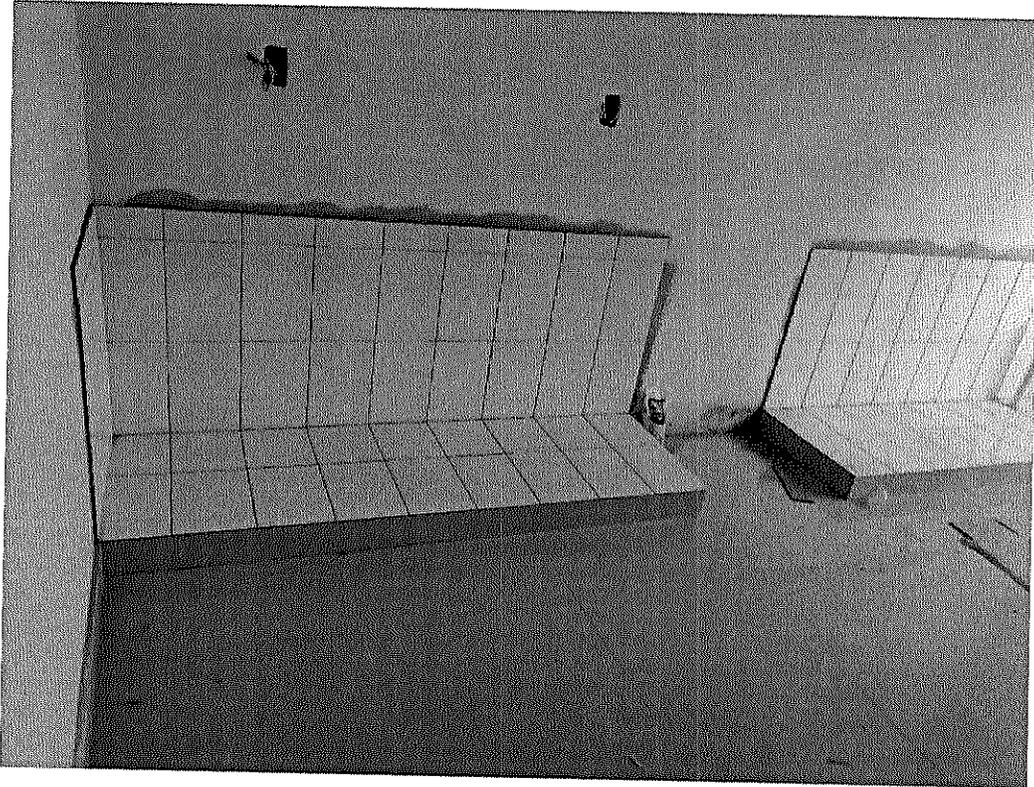


2. Colocación de muebles sobre base azulejada, en sector de Guardería 1P-14 (Sala de 1 a 2).

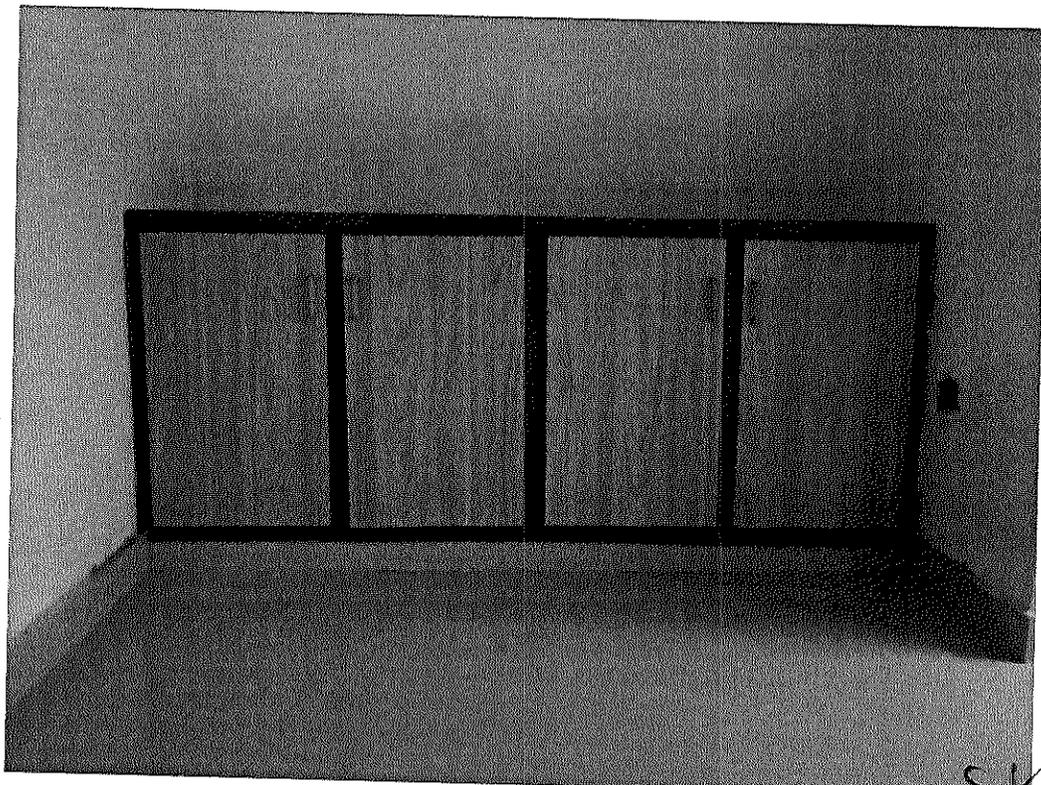

Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

3. Muestra de tonalidades preliminares, a ser utilizados en los distintos sectores indicados.

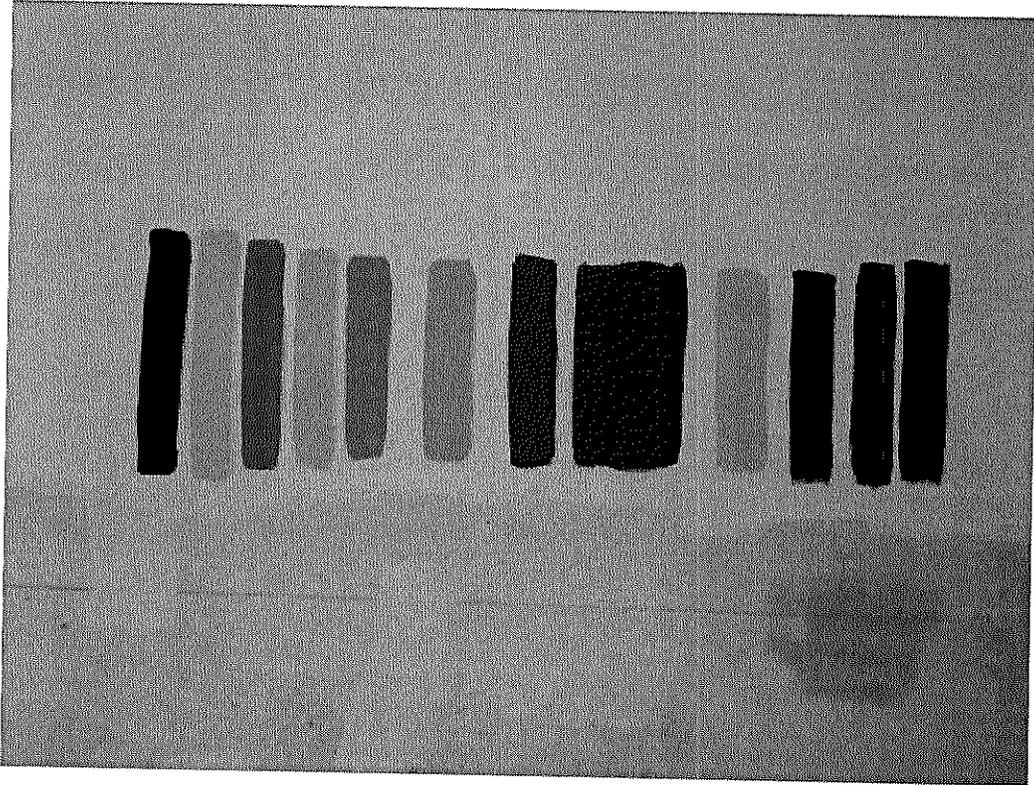


4. Montaje de perfileras de aluminio a ser utilizados en los cerramientos vidriados.



Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

5. Cerramiento con vidrios, en el sector de comedor con vista al Edificio Existente.

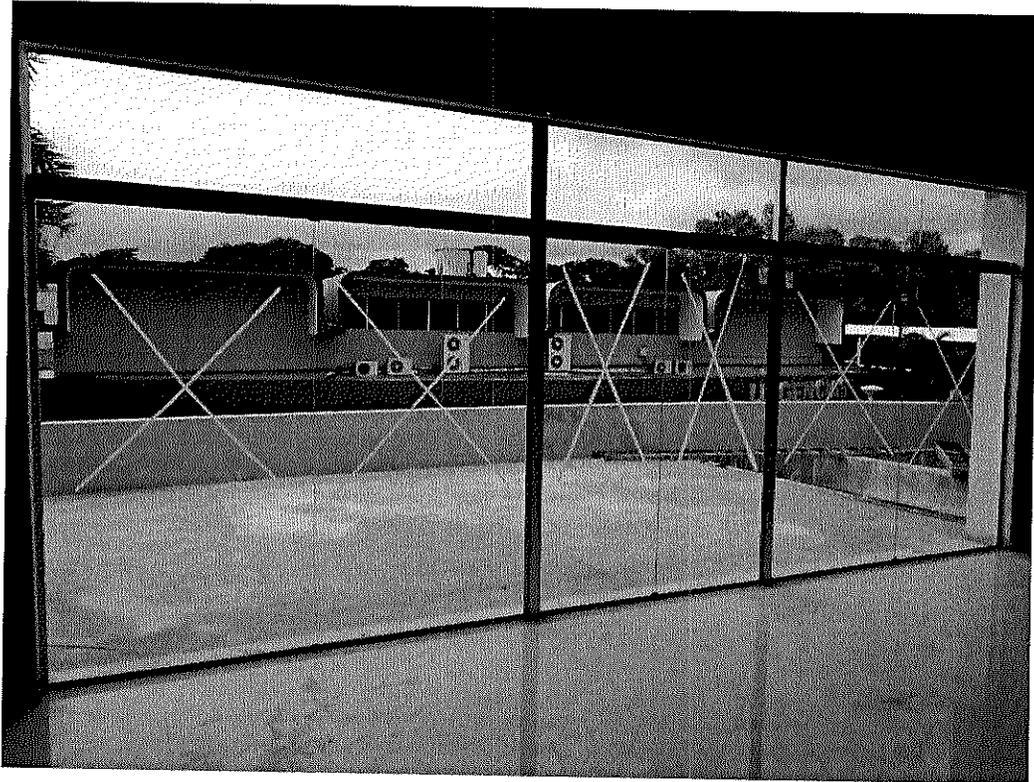

6. Cerramiento con vidrios, en el sector posterior de la Planta Planta (Vista hacia la calle).




Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

9. Revestimiento de la escalera principal, con colocación de planchas de Granito Reconstituido.



10. Montaje de la Baranda de Protección en la Planta Alta.

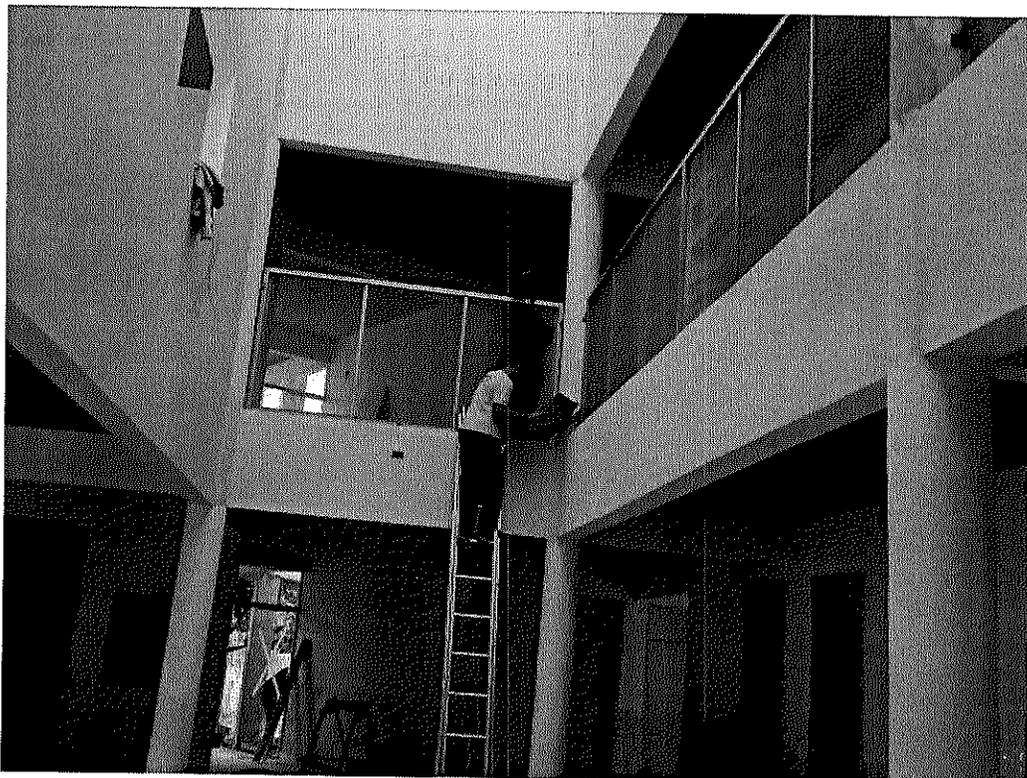

Juan A. Rodas V.
Ing. Civil

7. Revestimiento de escalera, con planchas de Granito reconstituido




8. Acceso principal al bloque. Cerramiento con vidrio, puertas, herrajes y accesorios instalados.




11. Acceso lateral al edificio, con las puertas y accesorios ya instalados. (Planta Baja)



12. Acceso lateral al edificio, con las puertas y accesorios ya instalados. (Planta Alta)

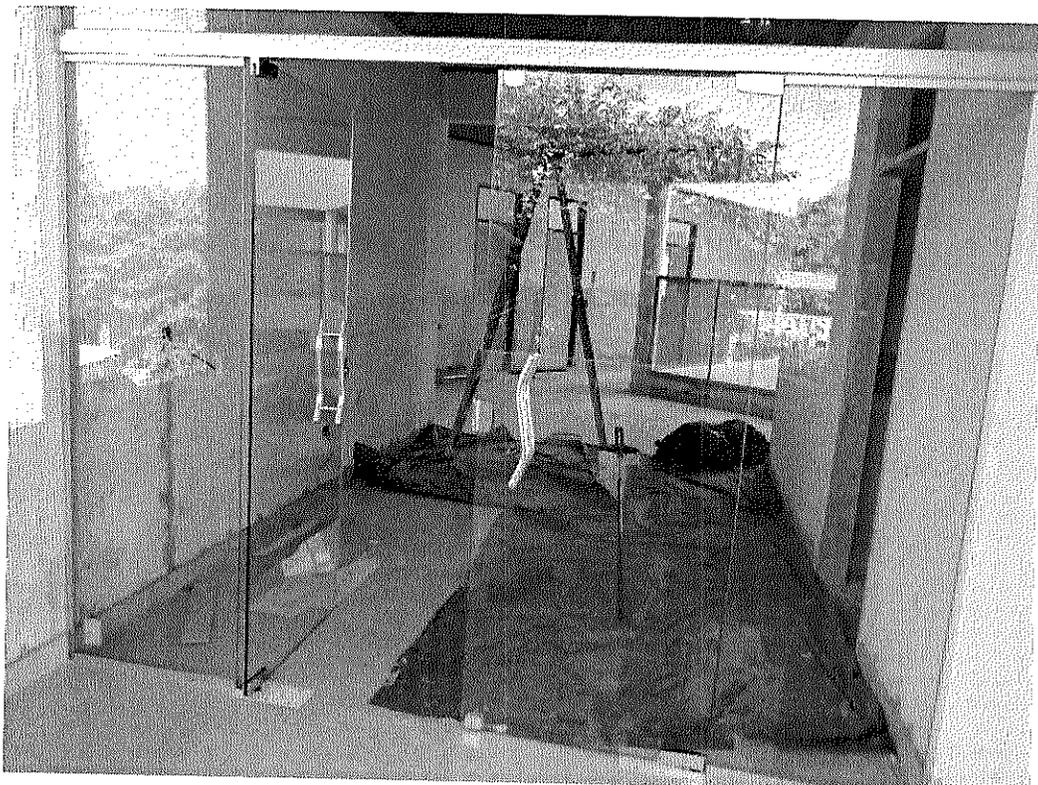

13. Revestimiento de PVC, en sector de circulación de la Planta Baja.

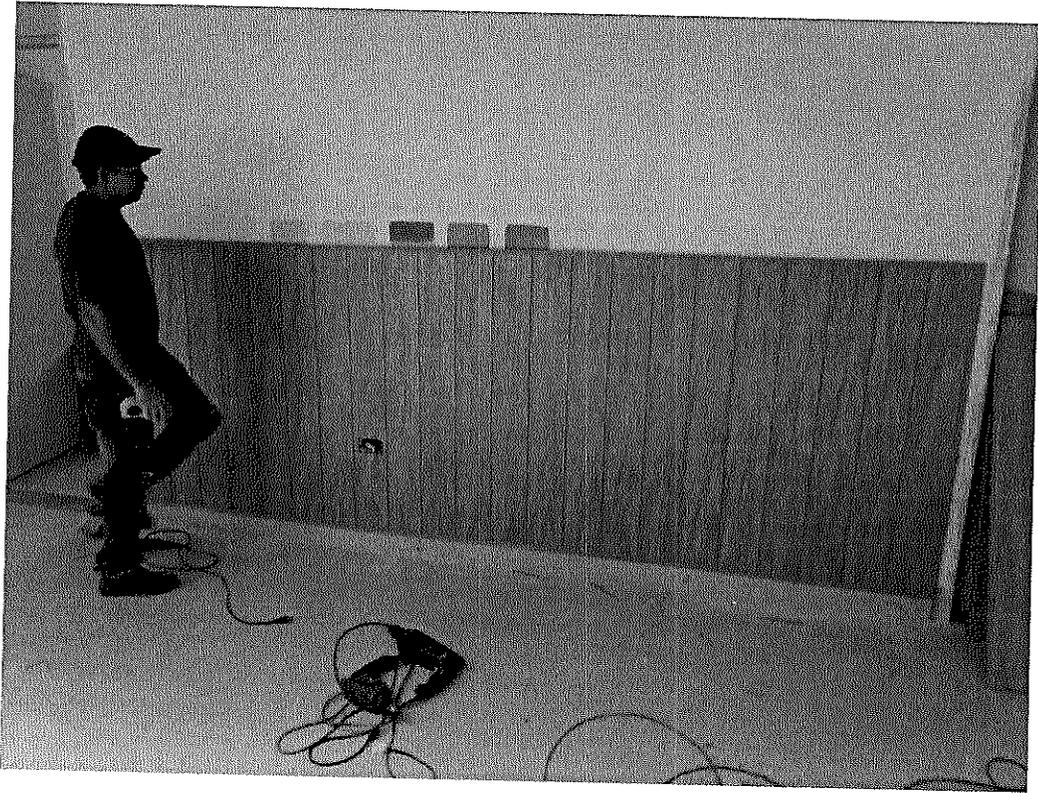

14. Revestimiento de la franja decorativa. Sanitarios especialmente diseñados de la Planta Baja.

